


Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Mayo / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAPAZ (II)

Organismo ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Número de Préstamo	JICA-GT-P6	Fecha de última actualización	12/06/2017
Código Presupuestario	5205090001	Fecha del Decreto	28/08/2012
Organismo Financiero	JICA	Fecha de Suscripción	06/11/2012
Moneda del Préstamo	JPY	Fecha de Vigencia	06/11/2012
Monto contratado	9,939,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	06/11/2012
Monto contratado Entidad ejecutora	9,939,000,000.00	Fecha de cierre actual	06/11/2019
Monto Entidad Ejecutora Dolares	1,101,439,980,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	73,051,650,000.00	Plazo de ejecución	64.73%
Desembolsos realizados a la fecha	3,324,046.25	Monto por desembolsar USD\$	86,358,693.95
			96.29%

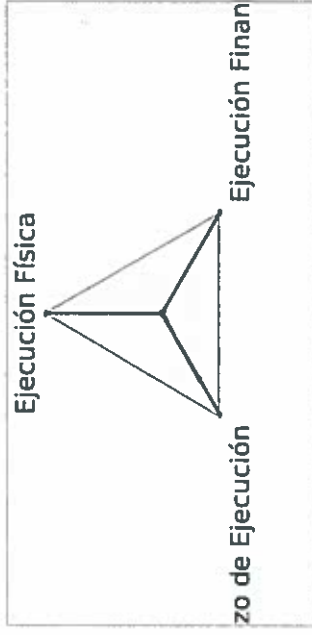

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.35 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	177.432.326.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	244.160.02	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	177.432.326.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.80% / 5.57%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Octubre	Plazo de ejecución Actual	66.00%		
		Presupuesto planificado próximo	20,226,703.49	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	5.8367		

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Obras Civiles									
Construcción Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	Porcentaje	0	0	0	0	0.21		0.21	0
Construcción Carretera Tramo 2: Seca - Lancelillo - Saquixpec - El Paraiso	Porcentaje	0	0	0	0	0.15		0.15	0
Construcción Carretera Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.	Porcentaje	0	0	0	0	0.06		0.06	0
Construcción Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan	Porcentaje	0	0	0	0	0.23		0.23	0
Construcción Carretera Tramo 5: Lanquin - Cahabon	Porcentaje	0	0	0	0	0.15		0.15	0
Componente: Servicios de Consultoría									
Diseño y Supervisión Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	Porcentaje	0	0.03	0	0.01	0.19		0.19	0.04
Diseño y Supervisión Tramo 2: Seca - Lancelillo - Saquixpec - El Paraiso	Porcentaje	0	0.03	0	0.01	0.19		0.19	0.04
Diseño y Supervisión Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela	Porcentaje	0	0.03	0	0.01	0.11		0.11	0.04
Diseño y Supervisión Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan	Porcentaje	0	0.03	0	0.01	0.21		0.21	0.04
Diseño y Supervisión Tramo 5: Lanquin - Cahabon	Porcentaje	0	0.03	0	0.01	0.22		0.22	0.04

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Método	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Obras Civiles											
Construcción Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca											
Construcción de carretera	Licitación Pública Internacional	30/11/2016	30/11/2016	20/01/2017	20/01/2017	21/03/2017		31/07/2017		31/08/2017	
Construcción Carretera Tramo 2: Seca - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso											
Construcción de Carretera	Licitación Pública Internacional	30/11/2016	01/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	21/03/2017		31/07/2017		31/08/2017	
Construcción Carretera Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.											
Construcción de Carretera	Licitación Pública Internacional	31/03/2017		31/05/2017		31/07/2017		31/10/2017		30/11/2018	
Construcción Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan											
Construcción de Carretera	Licitación Pública Internacional	30/11/2016	30/11/2016	20/01/2017	20/01/2017	21/03/2017		31/07/2017		31/08/2017	
Construcción Carretera Tramo 5: Lanquin - Cahabon											
Construcción de carretera	Licitación Pública Internacional	30/11/2016	30/11/2016	20/01/2017	20/01/2017	21/03/2017		31/07/2017		31/08/2017	

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Obras Civiles													
Construcción Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca													
Construcción de carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,634.32	603,310.64	1,096,855.04	1,845,800.02
Construcción Carretera Tramo 2: Seca - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso													
Construcción de Carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,634.32	448,210.30	726,728.40	1,320,573.02
Construcción Carretera Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.													
Construcción de Carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,434.70	329,306.72	463,741.42
Construcción Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan													
Construcción de Carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,306.72	733,674.60	935,568.00	2,133,004.02
Construcción Carretera Tramo 5: Lanquin - Cahabon													
Construcción de carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,634.32	448,210.30	726,728.40	1,320,573.02
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,309.68	2,367,849.54	3,815,206.56	7,053,691.50
Servicios de Consultoría													
Diseño y Supervisión Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca													
Contrato No. 049-2014-DGC-CONSULTORIA Diseño y Supervisión de Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,983.26	427,983.26	427,983.26	1,708,333.04
Diseño y Supervisión Tramo 2: Seca - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Contrato No. 049-2014-DGC-CONSULTORIA Diseño y Supervisión de Carretera Tramo 2 Seca - Lantcettillo - Saquixpec - El Paraiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,083.26	427,083.26	427,083.26	427,083.26	1,708,333.04
Diseño y Supervisión Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela													
Contrato No. 049-2014-DGC-CONSULTORIA Diseño y Supervisión de Carretera Tramo 3. El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,868.01	519,868.01	1,039,736.04
Diseño y Supervisión Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan													
Contrato No. 04-2014-DGC-CONSULTORIA Diseño y Supervisión de Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,888.30	427,888.30	427,888.30	427,888.30	1,711,553.44
Diseño y Supervisión Tramo 5: Lanquin - Cahabon													
Contrato No. 049-2014-DGC-CONSULTORIA Diseño y Supervisión de Carretera Tramo 5 Lanquin - Cahabon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,496.48	498,496.48	498,496.48	498,496.48	1,993,965.84
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,551.54	1,780,551.54	2,300,419.37	2,300,419.37	8,191,931.42
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,968.04	2,526,761.02	4,668,259.91	6,115,625.84	15,245,032.92

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	484,208.26	0.00	1,210,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,226,703.48	0.00	8,477,992.67
Realizado	244,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	240,048.23	0.00	1,210,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,226,703.48	0.00	8,477,992.67

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Profesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)	
	Tramo 2 - Sección - Lancelillo - Sequispec - El Paríaiso																
1	PUBLICACION DE BASE SEN	1	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017											
2	1 GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	87	23/04/2017	20/04/2017	23/04/2017												
3	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	25	23/04/2017	17/05/2017													
4	1 CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	8	20/02/2017	30/03/2017													
5	RECEPCION DE OFERTAS	1	20/04/2017	24/04/2017													
6	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	24	24/04/2017	18/05/2017													
7	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	19/05/2017	20/05/2017													
8	NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	25	22/05/2017	16/08/2017													
9	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	19/06/2017	20/06/2017													
10	1 APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	24/06/2017	22/06/2017													
11	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	22/06/2017	29/06/2017													
12	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	1	30/06/2017	04/07/2017													
13	NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	25	03/07/2017	28/07/2017													
14	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	31/07/2017	04/08/2017													
15	PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA PUBLICADA POR LA JUNTA	6	02/08/2017	08/08/2017													
16	1 LICITACION	1	09/08/2017	10/08/2017													
17	APROBACION CIV A LA ADJUDICACION PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES/	6	19/08/2017	17/08/2017													
18	REPOSICION A LA ADJUDICACION	13	18/08/2017	31/08/2017													
19	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	3	04/09/2017	04/09/2017													
20	CONTRATACION DE LAS OBRAS	23	05/09/2017	28/09/2017													
21	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	13	29/09/2017	12/10/2017													
22	SOLICITUD DE NO OBJECION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	3	11/10/2017	11/10/2017													
23	NO OBJECION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	27	17/10/2017	13/11/2017													
24	INICIO DE OBRAS	1	14/11/2017	15/11/2017													
25	GENERALES	684	15/11/2017	30/09/2019													
26	MOVIMIENTO DE TIERRAS	562	15/11/2017	31/05/2019													
27	ALCANTARILLAS	638	04/12/2017	31/08/2019													
28	REGLONES VARIOS	668	04/12/2017	30/09/2019													
29	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	517	04/04/2018	30/09/2019													
30	SEÑALIZACION	121	04/06/2018	30/09/2019													
31	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	04/07/2018	30/09/2019													
32	MEASURAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	684	15/11/2017	30/09/2019													
33	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS	61	04/07/2019	31/08/2019													
							0.15%		041,906,613.00	01320,571.02	041,906,613.00	00.00	0.00%	0.15%	0%	S	

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	%Avance Físico	Prodecoesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
Tramo 3 - El Paraiso - Río Copon -																
Asesoria Copon - San Juan Chacabala																
2	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO PRESENTADA POR LA DGC A CREDITO PUBLICO	2	23/11/2016	25/11/2016	23/11/2016	23/11/2016										
1	MINFIN	10	28/11/2016	20/03/2017	28/11/2016	20/03/2017										
2	ANUENCIA JICA	20	27/03/2017	10/04/2017												
4	ACTUALIZACION BASES DE LICITACION PUBLICACION DE BORRADOR DE BASES	6	11/04/2017	17/04/2017												
5	(SN PLANOS)	6	11/04/2017	24/04/2017												
6	DICTAMEN TECNICO	6	11/04/2017	24/04/2017												
7	DICTAMEN FINANCIERO	6	25/04/2017	01/05/2017												
8	DICTAMEN JURIDICO	6	02/05/2017	08/05/2017												
9	RESOLUCION DGC APROBANDO LOS DOCUMENTOS	2	09/05/2017	11/05/2017												
10	PUBLICACION DE BASES EN GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	3	12/05/2017	15/05/2017												
11	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	57	15/05/2017	12/07/2017												
12	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	27	15/05/2017	12/06/2017												
13	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	20	13/06/2017	03/07/2017												
14	RECEPCION DE OFERTAS	1	13/07/2017	11/07/2017												
15	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	25	11/07/2017	09/08/2017												
16	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	10/08/2017	11/08/2017												
17	NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	27	11/08/2017	07/09/2017												
18	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	3	08/09/2017	11/09/2017												
19	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	12/09/2017	13/09/2017												
20	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	13/09/2017	20/09/2017												
21	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	1	21/09/2017	22/09/2017												
22	NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	27	22/09/2017	19/10/2017												
23	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	33	20/09/2017	23/10/2017												
24	PERIODO DE ESPERA PARA INFORMIDADES A LA ADJUDICACION PUBLICADA POR LA JUNTA	6	24/10/2017	30/10/2017												
25	RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA	1	31/10/2017	01/11/2017												
26	PERIODO DE ESPERA A LA ADJUDICACION	6	02/11/2017	08/11/2017												
27	REPOSICION A LA ADJUDICACION	10	09/11/2017	22/11/2017												
28	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA DE LAS OBRAS	1	23/11/2017	24/11/2017												
29	CONTRATACION DE LAS OBRAS	23	27/11/2017	20/12/2017												
30	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	10	21/12/2017	03/01/2018												
31	SOLICITUD DE NO OBJECION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	1	04/01/2018	05/01/2018												
32	NO OBJECION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	25	08/01/2018	02/02/2018												
33	INICIO DE OBRAS	1	05/02/2018	06/02/2018												
34	GENERALES	601	06/02/2018	30/09/2019												
35	MOVIMIENTO DE TIERRAS	517	11/03/2018	31/07/2018												
36	ALCANTARILLAS	547	01/04/2018	30/09/2019												
37	REGLONES VARIOS	547	01/04/2018	30/09/2019												
38	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	486	01/06/2018	30/09/2019												
39	SEÑALIZACION	92	01/06/2018	01/08/2018												
40	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	01/07/2018	30/09/2019												
41	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	578	01/03/2018	30/09/2018												
42	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR PUENTES Y BOVEDAS	30	01/08/2018	31/08/2018												

S

0%

0.06%

0.00%

00.00

C37,330,000.00

C463,741.42

C37,330,000.00

0.06%

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Proveedor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
No.	Título 5: LAMQUIN - CAHABON															
1	PUBLICACION DE BASES EN GUATEMAMPAS Y DIARIO OFICIAL	1	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017										
2	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	87	23/01/2017	20/04/2017	23/01/2017											
3	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	25	23/01/2017	17/02/2017												
4	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	8	20/02/2017	10/03/2017												
5	RECEPCION DE OFERTAS	1	20/04/2017	20/04/2017												
6	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	24	24/04/2017	18/05/2017												
7	SOLICITUD DE NO OBJECCION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	19/05/2017	20/05/2017												
8	NO OBJECCION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	25	22/05/2017	16/06/2017												
9	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	19/06/2017	20/06/2017												
10	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	20/06/2017	22/06/2017												
11	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	22/06/2017	29/06/2017												
12	SOLICITUD DE NO OBJECCION DE JICA A ADJUDICACION	1	30/06/2017	01/07/2017												
13	NO OBJECCION DE JICA A ADJUDICACION	25	03/07/2017	28/07/2017												
14	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	3/07/2017	01/08/2017												
15	PERIODO DE ESPERA PARA INFORMIDADES A LA ADJUDICACION	6	02/08/2017	08/08/2017												
16	RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA	1	09/08/2017	10/08/2017												
17	LICITACION	6	10/08/2017	17/08/2017												
18	PERIODO DE ESPERA INFORMIDADES / REPOSICION A LA ADJUDICACION	13	18/08/2017	31/08/2017												
19	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	3	01/09/2017	04/09/2017												
20	CONTRATACION DE LAS OBRAS	23	05/09/2017	28/09/2017												
21	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	13	29/09/2017	11/10/2017												
22	SOLICITUD DE NO OBJECCION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	3	13/10/2017	16/10/2017												
23	NO OBJECCION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	27	17/10/2017	13/11/2017												
24	INICIO DE OBRAS	1	11/11/2017	15/11/2017												
25	GENERALES	684	15/11/2017	30/09/2019												
26	MOVIMIENTO DE TIERRAS	562	15/11/2017	31/05/2019												
27	ALCANTARILLAS	638	01/12/2017	31/08/2019												
28	BENGLONES VARIOS	668	01/12/2017	30/09/2019												
29	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	517	01/04/2018	30/09/2019												
30	SEÑALIZACION	121	01/06/2018	30/09/2019												
31	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	01/07/2018	30/09/2019												
32	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	684	15/11/2017	30/09/2019												
33	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS	61	01/07/2018	31/08/2019												
							0.5%		Q2,680,000.00	Q1,320,573.02	Q2,680,000.00	Q0.00	0.00%	0.5%	0%	SI

Observaciones/Desafíos

Los tramos I, II, IV y V del componente de obra civil se encuentran actualmente en etapa de licitación de obras por lo cual las cantidades son estimadas por la institución, en el momento de adjudicar los proyectos se conocerá el programa real de trabajo.

El cronograma de trabajo fue modificado debido a una ampliación de 21 días para la presentación de ofertas concedida a los licitantes de los tramos I, II, IV y V. La fecha de presentación de ofertas está programada para el 09 de junio de 2017 como consta en la adenda 7 de los concursos identificados con el NOG. 5626730, 5626773, 5626781 y 5664454.

Debido a la modificación de 21 días en el programa de trabajo de las licitaciones de los tramos I, II, IV y V; y al retraso en la notificación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas del expediente de cambio de ruta en el tramo III, los renglones a ejecutar durante el 2017 disminuyen.

El tramo III se encuentra pendiente de iniciar el proceso de licitación debido a gestiones previas realizadas entre la DGC y la Dirección de Crédito Público del MINFIN con el fin de realizar el cambio de ruta. El Ministerio de Finanzas Públicas emitió el Dictamen Número 186-2017-Daj de fecha 12 de mayo de 2017 en el cual en su parte conducente indica: "... La solicitud de la No Objeción a la Agencia de Cooperación Internacional del Japon -JICA- no se encuentra sujeta a la aprobación del Congreso de la República de Guatemala por lo que no es necesario que dicho expediente sea trasladado a esa instancia, en virtud de tratarse de variaciones sobre aspectos técnicos al referido proyecto". La Procuraduría General de la Nación con fecha 22 de mayo de 2017 dio su visto bueno al dictamen emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas por lo cual a la fecha únicamente se está a la espera de la notificación oficial por parte del Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar la No Objeción y de esta forma iniciar el proceso de licitación del tramo III.

El retraso en la notificación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas incide directamente en la ejecución de los fondos del préstamo debido a que retrasa el inicio de la licitación del tramo III y la Agencia de Cooperación Internacional de Japon -JICA- indicó que no es posible iniciar con la construcción de los 4 tramos restantes ya que deben iniciarse los 5 tramos al mismo tiempo.

La fecha de inicio de obras para este tramo está contemplada para el 1 de abril de 2018.

Riesgos:

Los proyectos se encuentran actualmente en etapa de licitación, por lo que las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos que modifiquen los tiempos estimados en el presente plan tales como:

- Inconformidades o impugnaciones a los procesos de licitación por oferentes.
- Retraso en la notificación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas del expediente de cambio de Ruta del Tramo III.
- Por ser cinco procesos de licitación en simultáneo, atraso en las NO OBJECIONES a lo actuado por la JUNTA y a la adjudicación por parte de JICA.
- El costo programado es en base al cálculo realizado por la institución, el cual variara con el costo de los oferentes, así como la programación.
- Con la variación del costo esto cambiaría el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.
- Debido al retraso en la etapa de licitación del tramo III por gestiones previas realizadas entre la DGC y la Dirección de Crédito Público del MINFIN, el proceso completo puede verse afectado debido a que para JICA el proyecto es un conjunto por lo tanto todos los tramos deben iniciar en simultáneo.

Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse en forma simultánea).

Que no exista cuota financiera aprobada de alguna de las fuentes de financiamiento.

Que sea cierre de cuatrimestre cuando los recursos del préstamo sean depositados por lo que el sistema SIGOIN ya esté cerrado.

Que el banco no apruebe el desembolso por incumplimiento de compromisos adquiridos en otros préstamos del mismo banco.

Elaborado por: (nombre y firma): Edwin Francisco García Rossi, COFINEX

Aprobado por: (nombre y firma): Juan José Hanser Pérez, DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS

Fecha de actualización: Mayo 2,017



Ing. Juan José Hanser Pérez

Director General

Dirección General de Caminos

Observaciones / Desafíos

Los tramos I, II, IV y V del componente de obra civil se encuentran actualmente en etapa de licitación de obras por lo cual las cantidades son estimadas por la institución, en el momento de adjudicar los proyectos se conocerá el programa real de trabajo.

El cronograma de trabajo fue modificado debido a una ampliación de 21 días para la presentación de ofertas concedida a los licitantes de los tramos I, II, IV y V. La fecha de presentación de ofertas está programada para el 09 de junio de 2017 como consta en la adenda 7 de los concursos identificados con el NOG. 5626730, 5626773, 5626781 y 5664454.

Debido a la modificación de 21 días en el programa de trabajo de las licitaciones de los tramos I, II, IV y V; y al retraso en la notificación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas del expediente de cambio de ruta en el tramo III, los renglones a ejecutar durante el 2017 disminuyen.

El tramo III se encuentra pendiente de iniciar el proceso de licitación debido a gestiones previas realizadas entre la DGC y la Dirección de Crédito Público del MINFIN con el fin de realizar el cambio de ruta. El Ministerio de Finanzas Públicas emitió el Dictamen Número 186-2017-Daj de fecha 12 de mayo de 2,017 en el cual en su parte conducente indica: "... La solicitud de la No Objeción a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón -JICA- no se encuentra sujeta a la aprobación del Congreso de la República de Guatemala por lo que no es necesario que dicho expediente sea trasladado a esa instancia, en virtud de tratarse de variaciones sobre aspectos técnicos al referido proyecto". La Procuraduría General de la Nación con fecha 22 de mayo de 2,017 dio su visto bueno al dictamen emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas por lo cual a la fecha únicamente se está a la espera de la notificación oficial por parte del Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar la No Objeción y de esta forma iniciar el proceso de licitación del tramo III.

El retraso en la notificación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas incide directamente en la ejecución de los fondos del préstamo debido a que retrasa el inicio de la licitación del tramo III y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón -JICA- indicó que no es posible iniciar con la construcción de los 4 tramos restantes ya que deben iniciarse los 5 tramos al mismo tiempo.


La fecha de inicio de obras para este tramo está contemplada para el 1 de abril de 2018.

Alertivos:

Los proyectos se encuentran actualmente en etapa de licitación, por lo que las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos que modifiquen los tiempos estimados en el presente plan tales como:

- Inconformidades o impugnaciones a los procesos de licitación por oferentes.
- Retraso en la notificación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas del expediente de cambio de Ruta del Tramo III.
- Por ser cinco procesos de licitación en simultáneo, atraso en las NO OBJECIONES a lo actuado por la JUNTA y a la adjudicación por parte de JICA.
- El costo programado es en base al cálculo realizado por la institución, el cual variara con el costo de los oferentes, así como la programación.
- Con la variación del costo esto cambiaría el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.
- Debido al retraso en la etapa de licitación del tramo III por gestiones previas realizadas entre la DGC y la Dirección de Crédito Público del MINFIN, el proceso completo puede verse afectado debido a que para JICA el proyecto es un conjunto por lo tanto todos los tramos deben iniciar en simultáneo.

- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse en forma simultánea).
- Que no exista cuota financiera aprobada de alguna de las fuentes de financiamiento.
- Que sea cierre de cuatrimestre cuando los recursos del préstamo sean depositados por lo que el sistema SICOIN ya esté cerrado.
- Que el banco no apruebe el desembolso por incumplimiento de compromisos adquiridos en otros préstamos del mismo banco.



Elaborado por: (nombre y firma) Edwin Francisco Garcia Rossi



Aprobado por: (nombre y firma) Juan José Hanser, Director General de Caminos

Ing. Juan José Hanser Pérez
Director General
Dirección General de Caminos

Vo.Bo. _____

Fecha de actualización 12/6/2017 - 12:00 PM
