

Plan Anual de Ejecución

Marzo
2017

¹Mes reportado


²Ejercicio Fiscal

³Proyecto/Programa: Zonapaz II

⁴Organismo Ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Dirección

General de Caminos.

5 Número de Préstamo	GT-P6	14 Fecha de última actualización	28/02/2017
6 Código Presupuestario	0509-0001	15 Fecha del decreto	07/08/2012
7 Organismo Financiero	JICA	16 Fecha de suscripción	06/11/2012
8 Entidad ejecutora	CIV	17 Fecha de Vigencia	06/11/2012
9 Unidad Ejecutora	DGC	18 Fecha de Elegibilidad	06/11/2012
10 Moneda del Préstamo	YENES JAPONESES	19 Fecha de cierre	06/11/2019
11 Monto aprobado	Y 9,939,000,000.00	20 Meses de Prórroga	0
12 Monto aprobado Q.	Q. 646,813,196.48	21 Plazo de ejecución	62.83 %
13 Desembolsos realizados a la fecha USD\$	\$ 2,811,313.34	22 Monto por desembolsar USD\$	\$83,129,767.00 96.73%

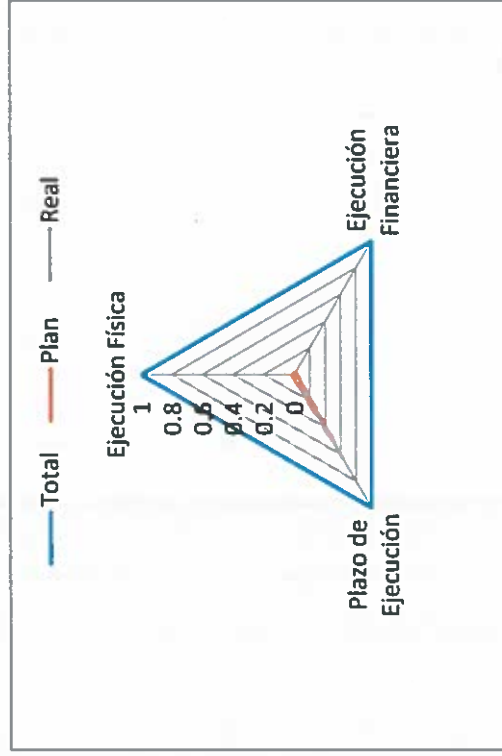

²³Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

	Mensual		Anual		Total	
Asignación Presupuestaria anual	Q.177,432,326.00	Desembolso planificado anual	Q.223,986,771.31	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera	3.27 %
Presupuesto Vigente anual	Q.177,432,326.00	Desembolso realizado	Q. 0.00	Ejecución Física de metas		
Presupuesto Devengado	Q.1,783,948.04	Diferencia	Q.222,214,022.27	Plazo de ejecución actual	25.00 %	
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes	Q. 0.00			
		Presupuesto planificado próximo	Q.578,783.45			

NOTA: El anticipo no consume presupuesto por lo que el monto de lo programado por desembolsar es diferente al monto requerido presupuestariamente

METAS Año FISCAL 2017

COMPONENTE	PRODUCTOS	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente de consultoría.	Mejoramiento y Pavimentación de Rutas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché.	0.25 %		0.25 %		0.91 %		1.41 %	
		0.25 %		0.25 %		0.65 %		1.15 %	
		0.00 %		0.00 %		0.26 %		0.26 %	

Plan de ADQUISICIONES AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente de consultoría	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas).	Mejoramiento y Pavimentación de Rutas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	2013	2013 NOG: 2548585	2014	2014 NOG: 2548585	2014	2014 NOG: 2548585	2014	2014 NOG: 2548585	2014	2014 NOG: 2548585
Componente de obra civil												
Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Rutas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	Nov -2016	Nov -2016	Ene -2017	Ene -2017 NOG: 5626730	Abr -2017	Abr -2017	Ago -2017	Ago -2017	Oct -2017	Oct -2017
Tramo 2: Seca - Lancellito - Saquixpec - El Paraiso	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Rutas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	Nov -2016	Nov -2016	Ene -2017	Ene -2017 NOG: 5626773	Abr -2017	Abr -2017	Ago -2017	Ago -2017	Oct -2017	Oct -2017
Tramo 3: El Paraiso - Río Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Rutas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	Mar -2017				Jul -2017		Nov -2017		Ene -2018	
Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Rutas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	Nov -2016	Nov -2016	Ene -2017	Ene -2017 NOG: 5626781	Abr -2017	Abr -2017	Ago -2017	Ago -2017	Oct -2017	Oct -2017
Tramo 5: Lanquin Cahabon	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Rutas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	Nov -2016	Nov -2016	Ene -2017	Ene -2017 NOG: 5664454	Abr -2017	Abr -2017	Ago -2017	Ago -2017	Oct -2017	Oct -2017


Ejecución Financiera Anual

2017													
COMPONENTE CONSULTORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2017
TOTAL COMPONENTE DE CONSULTORIA	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 2,345,419.37	Q 2,345,419.37	Q 10,488,673.24
DISEÑO DETALLADO Y APOYO EN PROCESO DE PRECALIFICACION Y LICITACION DE CONTRATISTAS	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 2,345,419.37	Q 2,345,419.37	Q 5,797,834.50
SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA											Q 2,345,419.37	Q 2,345,419.37	Q 4,690,838.74
SERVICIOS DE LIQUIDACION DE OBRAS													Q -
2012													
COMPONENTE OBRA CIVIL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2012
TOTAL COMPONENTE DE OBRA CIVIL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 571,337.66	Q 1,829,037.96	Q 2,400,375.62
Tramo 1: Chicaman - El Soch - Secá	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 145,634.32	Q 603,310.64	Q 748,944.96
GENERALES											Q 37,396.62	Q 18,934.70	Q 156,331.32
MOVIMIENTO DE TIERRAS											Q 74,737.70	Q 374,124.10	Q 448,861.90
ALCANTARILLAS												Q 34,251.84	Q 34,251.84
RENGLONES VARIOS											Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO											Q -	Q -	Q -
SEÑALIZACION													Q -
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL													Q -
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL											Q 33,500.00	Q 66,000.00	Q 99,500.00
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS													Q -
Tramo 2: Secá - Lanceticilo - Saquixpec - El Paraíso	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 145,634.32	Q 448,210.30	Q 593,844.62
GENERALES											Q 37,396.62	Q 10,934.70	Q 151,331.32
MOVIMIENTO DE TIERRAS											Q 74,737.70	Q 228,872.40	Q 303,410.10
ALCANTARILLAS											Q -	Q 28,543.20	Q 28,543.20
RENGLONES VARIOS											Q -	Q 11,060.00	Q 11,060.00
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO											Q -	Q -	Q -
SEÑALIZACION											Q -	Q -	Q -
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL											Q -	Q -	Q -
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL											Q 33,500.00	Q 66,000.00	Q 99,500.00
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS											Q -	Q -	Q -

Tramo 3: El Paraíso - Río Copón - Asención Copón - San Juan Chactela													
GENERALES													
MOVIMIENTO DE TIERRAS													
ALCANTARILLAS													
RENGLONES VARIOS													
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO													
SEÑALIZACION													
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL													
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL													
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS													
Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcán	Q									Q	134,434.70	Q 329,306.72	
GENERALES												Q 483,741.42	
MOVIMIENTO DE TIERRAS												Q 255,268.02	
ALCANTARILLAS												Q 149,475.40	
RENGLONES VARIOS												Q -	
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO												Q -	
SEÑALIZACION												Q -	
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL												Q -	
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL												Q -	
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS												Q -	
Tramo 5: Lanquín - Cahabón	Q										Q 145,634.32	Q 448,210.30	
GENERALES												Q 151,331.32	
MOVIMIENTO DE TIERRAS												Q 303,410.10	
ALCANTARILLAS												Q 28,543.20	
RENGLONES VARIOS												Q 11,060.00	
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO												Q -	
SEÑALIZACION												Q -	
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL												Q -	
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL												Q 99,500.00	
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS												Q -	
TOTAL GENERAL	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 2,916,757.03	Q 4,174,457.33	Q 12,889,048.88

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
Gasto real	579,783.45	579,783.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69,566.90
Gasto programado	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	2,916,757.03	4,174,457.33	12,889,048.86	

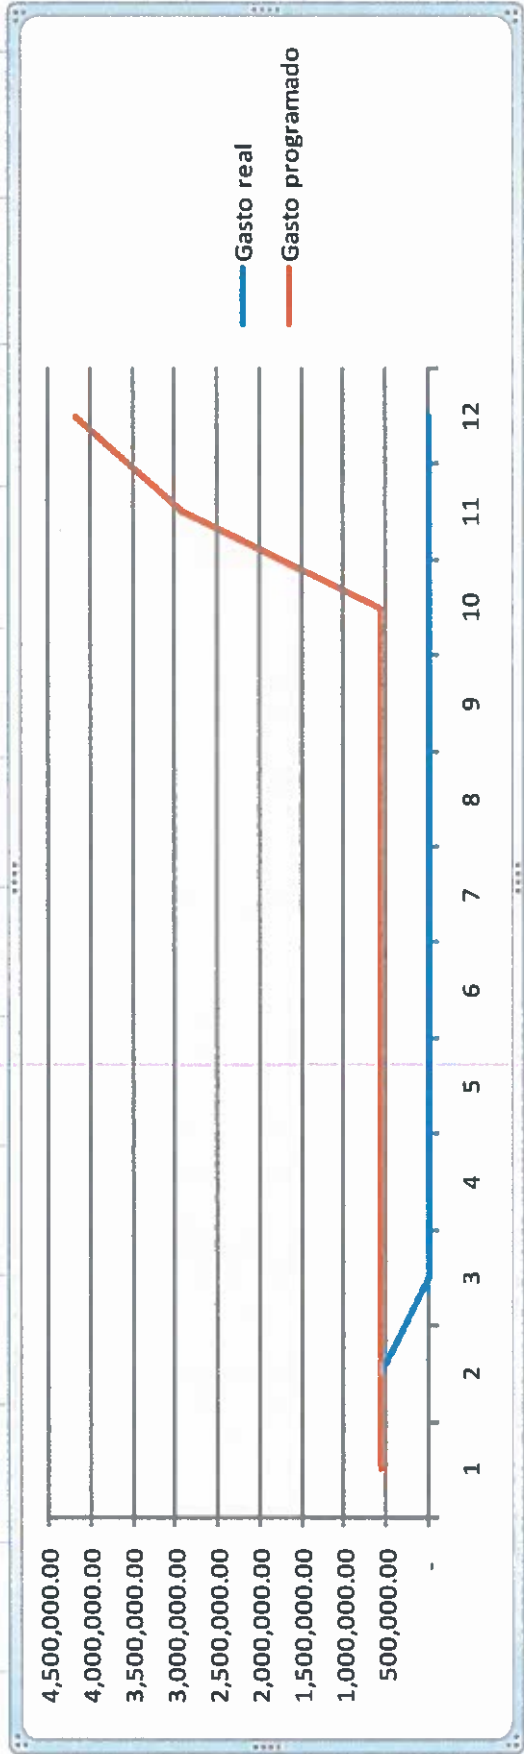

Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado	3,567,898.15	0.00	8,919,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,040,869.21	0.00	62,470,258.57	223,998,771.31
Realizado	1,783,949.04	0											
Variación	1,783,949.11	0.00											

Plan de Ejecución

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/M)
No.	COMPONENTE CONSULTORIA															
	DISEÑO DETALLADO Y APOYO EN PROCESO DE PRECALIFICACIÓN Y LICITACIÓN DE 1.CONTRATISTAS	1002	02/02/2015	31/10/2017	02/02/2015		1.15%		Q23,243,233.00	Q10,488,673.24	Q23,243,233.00	Q1,783,949.04	7.68%	1.15%		NO
	2.SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	688	01/11/2017	30/09/2019												NO
	3.SERVICIOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	122	01/10/2019	31/01/2020												NO
No.	COMPONENTE DE CONSULTORIA															
	Título 1: Chelemán - El Soch - Seca															
	1.PUBLICACION DE BASES EN GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	1	20/01/2017	21/01/2017	20/01/2017	20/01/2017										
	2.PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	87	23/01/2017	20/04/2017	23/01/2017											
	3.NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	25	23/01/2017	17/02/2017												
	4.CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	18	20/02/2017	10/03/2017												
	5.RECEPCION DE OFERTAS	1	20/04/2017	21/04/2017												
	6.EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	24	24/04/2017	19/05/2017												
	7.EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	19/05/2017	20/05/2017												
	8.OBJECCION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	25	22/05/2017	16/06/2017												
	9.AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	19/06/2017	20/06/2017												
	10.APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	21/06/2017	22/06/2017												
	11.EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	22/06/2017	29/06/2017												
	12.SOLICITUD DE NO OBJECCION DE JICA A ADJUDICACION	1	30/06/2017	01/07/2017												
	13.PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	25	03/07/2017	29/07/2017												
	14.ADJUDICACION	1	31/07/2017	01/08/2017												
	15.PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION PUBLICADA POR LA JUNTA	6	02/08/2017	09/08/2017												
	16.RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA LICITACION	1	09/08/2017	10/08/2017			0.08%		Q48,332,930.00	Q748,944.96	Q48,332,930.00	Q0.00	0.00%	0.08%		SI
	17.APROBACION CIV A LA ADJUDICACION	6	11/08/2017	17/08/2017												
	18.PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES / REPOSICION A LA ADJUDICACION	13	18/08/2017	31/08/2017												
	19.NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	3	01/09/2017	04/09/2017												
	20.CONTRATACION DE LAS OBRAS	23	05/09/2017	29/09/2017												
	21.ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	13	29/09/2017	12/10/2017												
	22.SOLICITUD DE NO OBJECCION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	3	13/10/2017	16/10/2017												
	23.NO OBJECCION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	27	17/10/2017	13/11/2017												
	24.INICIO DE OBRAS	1	14/11/2017	15/11/2017												
	25.GENERALES	684	15/11/2017	30/09/2019												
	26.MOVIMIENTO DE TIERRAS	562	15/11/2017	31/05/2019												
	27.ALCANTARILLAS	638	01/12/2017	31/09/2019												
	28.RENGLONES VARIOS	668	01/12/2017	30/09/2019												
	29.STRUCTURA DEL PAVIMENTO	547	01/04/2018	30/09/2019												
	30.SENALIZACION	121	01/06/2019	30/09/2019												
	31.SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	01/07/2019	30/09/2019												
	32.MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	684	15/11/2017	30/09/2019												
	33.STRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BODEVAS	61	01/07/2018	31/08/2018												

No.	No. Parealejo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Procesador	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/)
		Tramo 2: Sección Lanorillo - Saquisac - El Paralejo															
1		PUBLICACION DE BASES EN GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	1	20/01/2017	21/01/2017	20/01/2017	20/01/2017										
2		PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	87	23/01/2017	20/04/2017	23/01/2017											
3		NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	25	23/01/2017	17/02/2017												
4		CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	18	20/02/2017	10/03/2017												
5		RECEPCION DE OFERTAS	1	20/04/2017	21/04/2017												
6		EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	24	24/04/2017	18/05/2017												
7		SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	19/05/2017	20/05/2017												
8		NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	25	22/05/2017	16/06/2017												
9		AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	19/06/2017	20/06/2017												
10		APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	21/06/2017	22/06/2017												
11		EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	22/06/2017	29/06/2017												
12		SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	1	30/06/2017	01/07/2017												
13		NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	25	03/07/2017	28/07/2017												
14		PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	31/07/2017	01/08/2017												
15		PERIODO DE ESPERA PARA INFORMIDADES A LA ADJUDICACION PUBLICADA POR LA JUNTA RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA	6	02/08/2017	08/08/2017												
16		LICITACION	1	09/08/2017	10/08/2017												
17		APROBACION CIV A LA ADJUDICACION PERIODO DE ESPERA INFORMIDADES / REPOSICION A LA ADJUDICACION	6	11/08/2017	17/08/2017												
18		NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	3	01/09/2017	04/09/2017												
19		CONTRATACION DE LAS OBRAS	23	05/09/2017	28/09/2017												
20		ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	13	29/09/2017	12/10/2017												
21		SOLICITUD DE NO OBJECION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	3	13/10/2017	16/10/2017												
22		NO OBJECION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	27	17/10/2017	13/11/2017												
23		INICIO DE OBRAS	1	14/11/2017	15/11/2017												
24		GENERALES	684	15/11/2017	30/09/2019												
25		MOVIMIENTO DE TIERRAS	562	15/11/2017	31/05/2019												
26		ALCANTARILLAS	638	01/12/2017	31/08/2019												
27		RENGLONES VARIOS	668	01/12/2017	30/09/2019												
28		ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	547	01/04/2018	30/09/2019												
29		SEÑALIZACION	121	01/06/2019	30/09/2019												
30		SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	01/07/2019	30/09/2019												
31		MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	684	15/11/2017	30/09/2019												
32		ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS	61	01/07/2018	31/08/2018												
33																	
								0.06%		Q43,906,163.00	Q593,844.62	Q43,906,163.00	Q0.00	0.00%	0.06%	0%	SI

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/)
Tramo 3: El Peraimo - Río Copon - Asunción Copon - San Juan Chacabala															
1	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO PRESENTADA POR LA DGC A CREDITO PUBLICO MINFIN	2	23/11/2016	25/11/2016	23/11/2016	23/11/2016									
2	PRONUNCIAMIENTO DE CREDITO PUBLICO MINFIN	112	28/11/2016	20/03/2017	28/11/2016										
3	ANUENCIA JICA	20	21/03/2017	10/04/2017											
4	ACTUALIZACION BASES DE LICITACION	6	11/04/2017	17/04/2017											
5	PUBLICACION DE BORRADOR DE BASES (SIN PLANOS)	6	18/04/2017	24/04/2017											
6	PLANOS	6	18/04/2017	24/04/2017											
7	DICTAMEN TECNICO	6	25/04/2017	01/05/2017											
8	DICTAMEN FINANCIERO	6	02/05/2017	08/05/2017											
9	DICTAMEN JURIDICO	6	02/05/2017	08/05/2017											
10	RESOLUCION DGC APROBANDO LOS DOCUMENTOS	2	09/05/2017	11/05/2017											
11	PUBLICACION DE BASES EN GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	3	12/05/2017	15/05/2017											
12	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	57	16/05/2017	12/07/2017											
13	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	27	16/05/2017	12/06/2017											
14	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	20	13/06/2017	03/07/2017											
15	RECEPCION DE OFERTAS	1	13/07/2017	14/07/2017											
16	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	26	14/07/2017	09/08/2017											
17	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	10/08/2017	11/08/2017											
18	NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	27	11/08/2017	07/09/2017											
19	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	3	08/09/2017	11/09/2017											
20	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	13/09/2017	13/09/2017											
21	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	13/09/2017	20/09/2017											
22	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	1	21/09/2017	22/09/2017			0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	SI
23	NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION DE PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	33	22/09/2017	19/10/2017					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	SI
24	PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION PUBLICADA POR LA JUNTA	6	24/10/2017	30/10/2017											
25	RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA	1	31/10/2017	01/11/2017											
26	LICITACION	6	02/11/2017	08/11/2017											
27	APROBACION CIV A LA ADJUDICACION PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES / REPOSICION A LA ADJUDICACION	13	09/11/2017	22/11/2017											
28	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	1	23/11/2017	24/11/2017											
29	CONTRATACION DE LAS OBRAS	23	27/11/2017	20/12/2017											
30	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	13	21/12/2017	03/01/2018											
31	SOLICITUD DE NO OBJECION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	1	04/01/2018	05/01/2018											
32	NO OBJECION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	25	09/01/2018	02/02/2018											
33	INICIO DE OBRAS	1	05/02/2018	06/02/2018											
34	GENERALES	601	06/02/2018	30/09/2019											
35	MOVIMIENTO DE TIERRAS	517	01/03/2018	31/07/2019											
36	ALCANTARILLAS	547	01/04/2018	30/09/2019											
37	RENGLONES VARIOS	547	01/04/2018	30/09/2019											
38	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	466	01/06/2018	30/09/2019											
39	SEÑALIZACION	92	01/06/2019	01/09/2019											
40	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	01/07/2019	30/09/2019											
41	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	578	01/03/2018	30/09/2019											
42	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS	30	01/08/2018	31/08/2018											

No.	No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$M)
		Título 4: SAN JUAN CHACTELA - DUCAN															
	1	PUBLICACION DE BASES EN GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	1	20/01/2017	21/01/2017	20/01/2017	20/01/2017										
	2	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	87	23/01/2017	20/04/2017	23/01/2017											
	3	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	25	23/01/2017	17/02/2017												
	4	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	18	20/02/2017	10/03/2017												
	5	RECEPCION DE OFERTAS	1	20/04/2017	21/04/2017												
	6	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	24	24/04/2017	18/05/2017												
	7	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	19/05/2017	20/05/2017												
	8	NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	25	22/05/2017	16/06/2017												
	9	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	19/06/2017	20/06/2017												
	10	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	21/06/2017	22/06/2017												
	11	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	22/06/2017	29/06/2017												
	12	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	1	30/06/2017	01/07/2017												
	13	NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	25	03/07/2017	28/07/2017												
	14	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	31/07/2017	01/08/2017												
		PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION	6	02/08/2017	08/08/2017												
	15	PUBLICADA POR LA JUNTA RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA LICITACION	1	09/08/2017	10/08/2017			0.05%		Q21,940,000.00	Q463,741.42	Q21,940,000.00	Q0.00	0.00%	0.05%	0%	51
	16	APROBACION CIV A LA ADJUDICACION	6	11/08/2017	17/08/2017												
	17	PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES / REPOSICION A LA ADJUDICACION	13	18/08/2017	31/08/2017												
	18	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	3	01/09/2017	04/09/2017												
	19	CONTRATACION DE LAS OBRAS	23	05/09/2017	28/09/2017												
	20	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	13	29/09/2017	12/10/2017												
	21	SOLICITUD DE NO OBJECION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	3	13/10/2017	16/10/2017												
	22	NO OBJECION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	27	17/10/2017	13/11/2017												
	23	INICIO DE OBRAS	1	14/11/2017	15/11/2017												
	24	GENERALES	684	15/11/2017	30/09/2019												
	25	MOVIMIENTO DE TIERRAS	546	01/12/2017	31/05/2019												
	26	ALCANTARILLAS	607	01/01/2018	31/03/2019												
	27	RENGLONES VARIOS	637	01/01/2018	30/09/2019												
	28	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	547	01/04/2018	30/09/2019												
	29	SEÑALIZACION	121	01/06/2019	30/09/2019												
	30	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	01/07/2019	30/09/2019												
	31	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	684	15/11/2017	30/09/2019												
	32	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS	61	01/07/2018	31/08/2018												

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Final	% Avance Físico	Prodecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/)
No.	Tramo 5: LAJOIJUN - CAHABON															
1	PUBLICACION DE BASES EN GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	1	20/01/2017	21/01/2017	20/01/2017	20/01/2017										
2	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	87	23/01/2017	20/04/2017	23/01/2017											
3	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	25	23/01/2017	17/02/2017												
4	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	18	20/02/2017	10/03/2017												
5	RECEPCION DE OFERTAS	1	20/04/2017	21/04/2017												
6	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	24	24/04/2017	18/05/2017												
7	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	19/05/2017	20/05/2017												
8	NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	25	22/05/2017	16/06/2017												
9	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	19/06/2017	20/06/2017												
10	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	21/06/2017	22/06/2017												
11	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	22/06/2017	29/06/2017												
12	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	1	30/06/2017	01/07/2017												
13	NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	25	03/07/2017	28/07/2017												
14	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	31/07/2017	01/08/2017												
15	PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA	6	02/08/2017	08/08/2017												
16	LICITACION	1	09/08/2017	10/08/2017												
17	APROBACION CIV A LA ADJUDICACION	6	11/08/2017	17/08/2017												
18	PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES / REPOSICION A LA ADJUDICACION	13	18/08/2017	31/08/2017												
19	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	3	01/09/2017	04/09/2017												
20	CONTRATACION DE LAS OBRAS	23	05/09/2017	28/09/2017												
21	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	13	29/09/2017	12/10/2017												
22	SOLICITUD DE NO OBJECION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	3	13/10/2017	16/10/2017												
23	NO OBJECION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	27	17/10/2017	13/11/2017												
24	INICIO DE OBRAS	1	14/11/2017	15/11/2017												
25	GENERALES	684	15/11/2017	30/09/2019												
26	MOVIMIENTO DE TIERRAS	562	15/11/2017	31/05/2019												
27	ALCANTARILLAS	638	01/12/2017	31/08/2019												
28	RENGLONES VARIOS	668	01/12/2017	30/09/2019												
29	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	547	01/04/2018	30/09/2019												
30	SEÑALIZACION	121	01/06/2019	30/09/2019												
31	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	01/07/2019	30/09/2019												
32	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	694	15/11/2017	30/09/2019												
33	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS	61	01/07/2018	31/08/2018												
							0.07%		02.680,000.00	0593,844.62	02.680,000.00	00.00	0.00%	0.07%	0%	SI

Observaciones/Desafíos

Los tramos I, II, IV y V del componente de obra civil se encuentran actualmente en etapa de licitación de obras por lo cual actualmente las cantidades son estimadas por la institución, en el momento de adjudicar los proyectos se conocerá el programa real de trabajo.

El cronograma de trabajo fue modificado debido a una ampliación de 30 días para la presentación de ofertas concedida a los licitantes de los tramos I, II, IV y V. La fecha de presentación de ofertas está programada para el 20 de abril de 2017 como consta en la adenda 1 de los concursos identificados con el NOG. 5626730, 5626773, 5626781 y 5664454.

Debido a la modificación de 30 días en el programa de trabajo, los renglones a ejecutar durante el 2017 disminuyeron para los tramos I, II, IV y V.

El tramo III se encuentra pendiente de iniciar el proceso de licitación debido a gestiones previas realizadas entre la DGC y la Dirección de Crédito Público del MINFIN. La fecha de inicio de obras para este tramo está contemplada para el 2 de febrero de 2018.

Riesgos:

Los proyectos se encuentran actualmente en etapa de licitación, por lo que las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos que modifiquen los tiempos estimados en el presente plan tales como:

- Inconformidades o impugnaciones a los procesos de licitación por oferentes.
- Por ser cinco procesos de licitación en simultáneo, atraso en las NO OBJECIONES a lo actuado por la JUNTA y a la adjudicación por parte de JICA.
- El costo programado es en base al cálculo realizado por la institución, el cual variara con el costo de los oferentes, así como la programación.
- Con la variación del costo esto cambiaría el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.

Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse en forma simultánea).

Que no exista cuota financiera aprobada de alguna de las fuentes de financiamiento.

Que sea cierre de cuatrimestre cuando los recursos del préstamo sean depositados por lo que el sistema SICOIN ya esté cerrado.

Que el banco no apruebe el desembolso por incumplimiento de compromisos adquiridos en otros préstamos del mismo banco.

Elaborado por: (nombre y firma)  Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Aprobado por: (nombre y firma)  Ing. Civil Armando Fuentes Roca
Director General
(Dirección General de Caminos

Fecha de actualización _____ MARZO 2017
