

Plan Anual de Ejecución

Mes reportado

FEBRERO

Ejercicio Fiscal


2017

Proyecto/Programa: Zonapaz II

Organismo Ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Dirección

General de Caminos.

Número de Préstamo	GT-P6	¹⁴ Fecha de última actualización	31/01/2017
Código Presupuestario	0509-0001	¹⁵ Fecha del decreto	07/08/2012
Organismo Financiero	JICA	¹⁶ Fecha de suscripción	06/11/2012
Entidad ejecutora	CIV	¹⁷ Fecha de Vigencia	06/11/2012
Unidad Ejecutora	DGC	¹⁸ Fecha de Elegibilidad	06/11/2012
⁰ Moneda del Préstamo	VENES JAPONESSES	¹⁹ Fecha de cierre	06/11/2019
¹ Monto aprobado	Y 9,939,000,000.00	²⁰ Meses de Prórroga	0
² Monto aprobado Q.	Q. 646,813,196.48	²¹ Plazo de ejecución	61.60 %
³ Desembolsos realizados la fecha USD\$	\$ 2,811,313.34	²² Monto por desembolsar USD\$	\$83,129,767.00
			96.73%

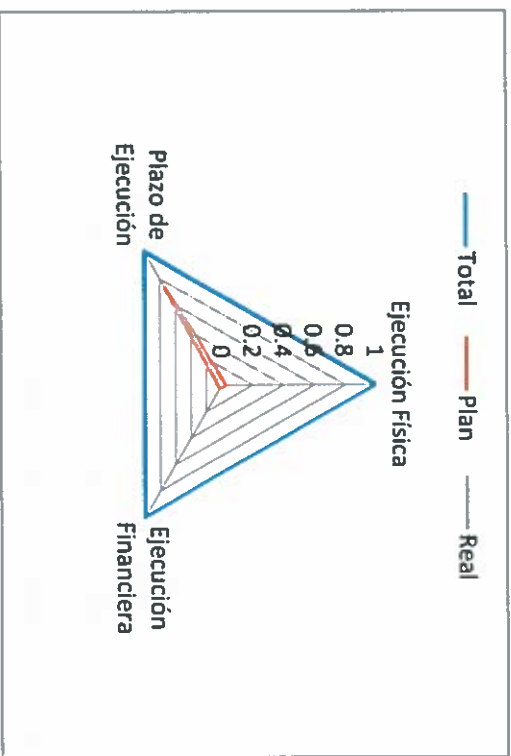

²³Suscripción

Con. Previa

Ejecución

Cierre

	Mensual		Anual		Total		
Asignación Presupuestaria anual	0.177.432.326.00	Desembolso planificado anual	0.223.996.771.31	Ejecución Financiera	0.06 % / 2.31 %	Ejecución Financiera	3.27 %
Presupuesto Vigente anual	0.177.432.326.00	Desembolso realizado	0.1.783.946.04	Ejecución Física de metas	0.06 % / 2.31 %		
Presupuesto Devengado	0.1.783.946.04	Diferencia	0.222.214.822.27	Plazo de ejecución actual	16.66 %		
% de Ejecución Presupuestaria		Próximo desembolso del mes	0.6.919.745.38				
		Presupuesto planificado próximo	0.579.783.45				

NOTA: El anticipo no consume presupuesto por lo que el monto de lo programado por desembolsar es diferente al monto requerido presupuestariamente

METAS Año FISCAL 2017

COMPONENTE	PRODUCTOS	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
	Mejoramiento y Pavimentación de Rutas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché.	0.25 %		0.25 %		1.81 %		2.31 %	
Componente de consultoría.		0.25 %		0.25 %		1.03 %		1.53 %	
Componente de obra civil.		0.00 %		0.00 %		0.78 %		0.78 %	

Plan de ADQUISICIONES AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente de consultoría	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas).	Mejoramiento y Pavimentación de Fulas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	2013	2013 NOG: 2548585	2014	2014 NOG: 2548585	2014	2014 NOG: 2548585	2014	2014 NOG: 2548585	2014	2014 NOG: 2548585
Componente de obra civil	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Fulas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché										
Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Fulas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	Nov -2016	Nov -2016	Ene - 2017	Ene-2017 NOG: 5626730	Mar - 2017		Jul - 2017		Ago - 2017	
Tramo 2: Seca - Lancellito - Saquixpec - El Paraiso	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Fulas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	Nov -2016	Nov -2016	Ene - 2017	Ene - 2017 NOG: 5626773	Mar - 2017		Jul - 2017		Ago - 2017	
Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Fulas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	Mar -2017		May - 2017		Jul - 2017		Oct - 2017		Nov - 2017	
Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcán	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Fulas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	Nov -2016	Nov -2016	Ene - 2017	Ene -2017 NOG: 5626781	Mar - 2017		Jul - 2017		Ago - 2017	
Tramo 5: Lanquin Cahabon	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)	Mejoramiento y Pavimentación de Fulas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché	Nov -2016	Nov -2016	Ene - 2017	Ene - 2017 NOG: 5664454	Mar - 2017		Jul - 2017		Ago - 2017	


Ejecución Financiera Anual

COMPONENTE CONSULTORIA	2017												TOTAL 2017	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
TOTAL COMPONENTE DE CONSULTORIA	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 4,638,267.60
DISEÑO DETALLADO Y APOYO EN PROCESO DE PRECALIFICACION Y LICITACION DE CONTRATISTAS	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 4,638,267.60
SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA									Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 2,345,493.37	Q 9,381,877.48
SERVICIOS DE LIQUIDACION DE OBRAS														Q -
COMPONENTE OBRA CIVIL	2017													
TOTAL COMPONENTE DE OBRA CIVIL	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 134,434.70	Q 766,209.66	Q 2,367,840.54	Q 3,862,06.58	Q 7,083,691.50	
Tramo 1: Chicaman - El Soch - Secá	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 145,634.32	Q 803,302.64	Q 1,096,855.08	Q 1,845,800.02	Q 1,845,800.02	
GENERALES								Q -	Q 37,396.62	Q 18,934.70	Q 18,934.70	Q 18,934.70	Q 275,266.02	
MOVIMIENTO DE TIERRAS								Q -	Q 74,737.70	Q 374,124.30	Q 420,261.10	Q 869,122.90	Q 869,122.90	
ALCANTARILLAS								Q -	Q -	Q 34,251.84	Q 473,659.26	Q 507,911.10	Q 507,911.10	
RENGLONES VARIOS								Q -	Q 0,000.00	Q 0,000.00	Q 0,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
SEÑALIZACION								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL								Q -	Q 33,500.00	Q 66,000.00	Q 74,000.00	Q 74,000.00	Q 73,500.00	
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
Tramo 2: Secá - Lancetillo - Saquilxpec - El Paraiso	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 145,634.32	Q 448,230.30	Q 726,728.40	Q 1,320,573.02	Q 1,320,573.02	
GENERALES								Q -	Q 37,396.62	Q 113,934.70	Q 183,934.70	Q 265,266.02	Q 265,266.02	
MOVIMIENTO DE TIERRAS								Q -	Q 74,737.70	Q 228,672.40	Q 266,159.40	Q 569,568.50	Q 569,568.50	
ALCANTARILLAS								Q -	Q -	Q 28,543.20	Q 28,157.30	Q 290,181.50	Q 290,181.50	
RENGLONES VARIOS								Q -	Q 11,060.00	Q 11,060.00	Q 11,060.00	Q 22,420.00	Q 22,420.00	
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
SEÑALIZACION								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL								Q -	Q 33,500.00	Q 66,000.00	Q 74,000.00	Q 74,000.00	Q 73,500.00	
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	

Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asenci6n Cop6n - San Juan Chactela															
GENERALES															
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
ALCANTARILLAS															
RENGLONES VARIOS															
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO															
SEÑALIZACION															
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL															
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL															
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS															
Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan															
GENERALES															
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
ALCANTARILLAS															
RENGLONES VARIOS															
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO															
SEÑALIZACION															
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL															
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL															
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS															
Tramo 5: Lanquin - Cahab6n															
GENERALES															
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
ALCANTARILLAS															
RENGLONES VARIOS															
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO															
SEÑALIZACION															
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL															
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL															
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS															
TOTAL GENERAL	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 579,783.45	Q 2,479,854.07	Q 3,116,291.05	Q 4,732,659.91	Q 6,460,625.95	Q 21,703,636.58

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	579,783.45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,783.45
Gasto programado	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	2,479,854.07	3,111,629.05	4,733,259.91	6,360,625.95	21,103,636.58

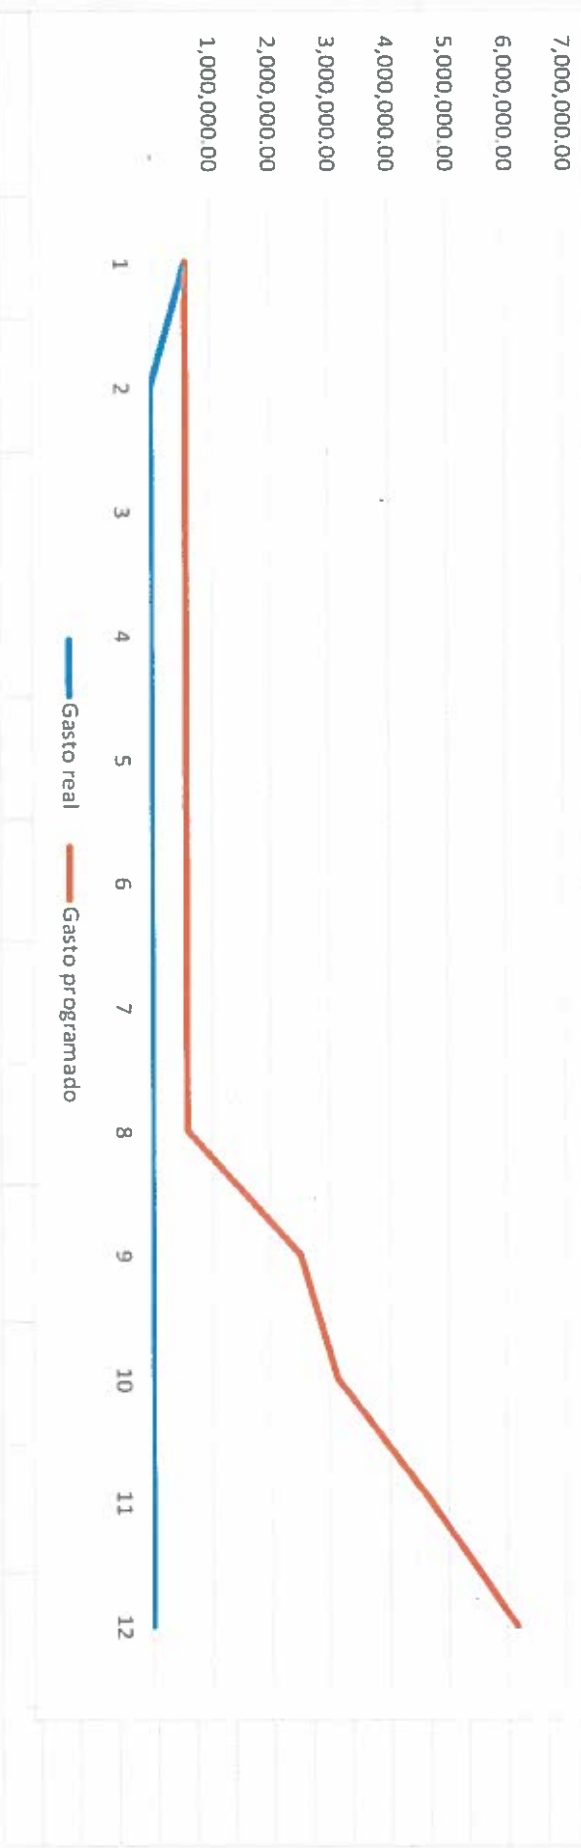

Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado	3,567,898.15	0.00	8,939,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,040,869.21	0.00	62,470,258.57	223,998,771.31
Realizado	1,783,949.04												
Variación	1,783,949.11												

Plan de Ejecución

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	A signación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
COM PONENTE CONSULTORIA																
No.	COM PONENTE CONSULTORIA															
1	DISEÑO DETALLADO Y APOYO EN PROCESO DE PRECALIFICACION Y LICITACION DE CONTRATISTAS	941	02/02/2015	31/08/2017	02/02/2015		153%		Q23,243,233.00	Q14,079,945.08	Q23,243,233.00	Q1783,949.04	7.68%	153%		NO
2	SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA	759	01/09/2017	30/09/2019												NO
3	SERVICIOS DE LIQUIDACION DE OBRA	22	01/01/2019	31/01/2020			2									NO
COM PONENTE DE CONSULTORIA																
Tamaño: 1: Chicanam - El Soch - Sech																
1	PUBLICACION DE BASES EN GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	1	20/01/2017	21/01/2017	20/01/2017	20/01/2017										
2	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	59	21/01/2017	21/03/2017	21/01/2017		1									
3	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	25	23/01/2017	17/02/2017			2									
4	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	8	20/02/2017	10/03/2017			3									
5	RECEPCION DE OFERTAS	1	22/03/2017	23/03/2017			4									
6	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	26	23/03/2017	18/04/2017			5									
7	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	1	19/04/2017	20/04/2017			6									
8	NO OBJECCION DE OFERTAS TECNICAS	27	20/04/2017	17/05/2017			7									
9	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	18/05/2017	19/05/2017			8									
10	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	21/05/2017	22/05/2017			9									
11	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	23/05/2017	30/05/2017			10									
12	SOLICITUD DE NO OBJECCION DE OFERTAS TECNICAS	1	30/05/2017	31/05/2017			11									
13	NO OBJECCION DE OFERTAS TECNICAS	27	01/06/2017	28/06/2017			12									
14	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE PERIODO DE ESPERRA PARA RECONFORMIDADES A LA ADJUDICACION	1	29/06/2017	30/06/2017			13									
15	INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA LICITACION	4	03/07/2017	07/07/2017			14		Q48,332,930.00	Q18,458,000.02	Q48,332,930.00	Q0.00	0.00%	0.20%	0%	5
16	PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES / REPOSICION A LA ADJUDICACION	6	10/07/2017	16/07/2017			15									
17	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	1	12/07/2017	13/07/2017			16									
18	CONTRATACION DE LAS OBRAS	25	04/08/2017	29/08/2017			17									
19	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	1	30/08/2017	31/08/2017			18									
20	SOLICITUD DE NO OBJECCION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	1	01/09/2017	02/09/2017			19									
21	NO OBJECCION DE OFERTAS	5	03/09/2017	07/09/2017			20									
22	INICIO DE OBRAS	0	04/09/2017	04/09/2017			21									
23	GENERALIDADES	729	01/10/2017	30/09/2019			22									
24	MOVIMIENTO DE TIERRAS	607	01/10/2017	31/05/2019			23									
25	ALCANTARILLAS	668	01/10/2017	31/08/2019			24									
26	RENGLONES VARIOS	698	01/10/2017	30/09/2019			25									
27	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	547	01/04/2018	30/09/2019			26									
28	SENAIALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	21	01/06/2019	30/09/2019			27									
29	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	729	01/07/2019	30/09/2019			28									
30	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS	81	01/07/2018	31/08/2018			29									
31							24									

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predcesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
Tarea 2: Secc - Lancelillo - Saquilzpac - El Paraiso																
1	PUBLICACION DE BASES EN GUATECOMPARAS Y DIARIO OFICIAL	1	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017										
2	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	59	20/04/2017	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	1									
3	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	25	23/04/2017	17/02/2017			2									
4	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	8	20/02/2017	03/03/2017			3									
5	RECEPCION DE OFERTAS	1	22/03/2017	23/03/2017			4									
6	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	26	23/03/2017	04/04/2017			5									
7	SOLICITUD DE NO OBJECCION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	04/04/2017	20/04/2017			6									
8	NO OBJECCION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	27	20/04/2017	17/05/2017			7									
9	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	05/05/2017	05/05/2017			8									
10	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	20/05/2017	22/05/2017			9									
11	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	23/05/2017	30/05/2017			10									
12	SOLICITUD DE NO OBJECCION DE JICA A ADJUDICACION	1	30/05/2017	30/05/2017			11									
13	NO OBJECCION DE JICA A ADJUDICACION	27	01/06/2017	28/06/2017			12									
14	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	29/06/2017	30/06/2017			13									
15	PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA JUNTA RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA	4	03/07/2017	07/07/2017			14		043.906.63.00	01320.573.02	043.906.63.00	00.00	0.00%	0.14%	0%	5
16	RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA	1	07/07/2017	07/07/2017			15									
17	APROBACION CIV A LA ADJUDICACION	6	07/07/2017	07/07/2017			16									
18	PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES/ REPOSICION A LA ADJUDICACION	13	07/07/2017	08/08/2017			17									
19	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	1	02/08/2017	03/08/2017			18									
20	CONTRATACION DE LAS OBRAS	25	04/08/2017	29/08/2017			19									
21	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	3	30/08/2017	09/09/2017			20									
22	SOLICITUD DE NO OBJECCION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	1	09/09/2017	14/09/2017			21									
23	NO OBJECCION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	6	09/09/2017	01/10/2017			22									
24	INICIO DE OBRAS	0	01/10/2017	01/10/2017			23									
25	GENERALES	729	01/10/2017	30/09/2019			24									
26	MOVIMIENTO DE TIERRAS	607	01/10/2017	30/09/2019			25									
27	ALCANTARILLAS	668	01/10/2017	30/09/2019			24 Y 25									
28	RENGLONES VARIOS	698	01/10/2017	30/09/2019			24									
29	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	547	01/04/2018	30/09/2019			25, 26 Y 27									
30	SEÑALIZACION	121	01/06/2019	30/09/2019			29									
31	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL SOCIAL	91	01/07/2019	30/09/2019			29									
32	MEIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y Puentes y Boveras	729	01/10/2017	30/09/2019			24									
33	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVERAS	61	01/07/2018	30/08/2018			24									

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Procesador	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	A signación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	M eta Planificada	M eta Real	Inversión Nueva (S/N)
Tramo 3: El Paraíso - Río Copón - Asesión Copón - San Juan Chacela																
No.	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO PRESENTADA POR LA DGC A CREDITO	2	23/11/2016	25/11/2016	23/11/2016	23/11/2016										
1	PUBLICOMI.NIFIN	74	28/11/2016	10/02/2017	28/11/2016											
2	ANUENCIA JICA	8	13/02/2017	03/03/2017												
3	ACTUALIZACION BASES DE LICITACION	4	08/03/2017	10/03/2017												
4	PUBLICACION DE BORRADOR DE BASES (SIN PLANOS)	4	13/03/2017	17/03/2017												
5	DICTAMEN TECNICO	4	13/03/2017	17/03/2017												
6	DICTAMEN FINANCIERO	4	20/03/2017	24/03/2017												
7	DICTAMEN JURIDICO	4	27/03/2017	31/03/2017												
8	RESOLUCION DGC APROBANDO LOS DOCUMENTOS	2	03/04/2017	05/04/2017												
9	PUBLICACION DE BASES EN GUATEMPALAS Y DIARIO OFICIAL	1	06/04/2017	07/04/2017												
10	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	57	10/04/2017	06/06/2017												
11	NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE LICITACION	25	10/04/2017	05/05/2017												
12	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	8	08/05/2017	26/05/2017												
13	RECEPCION DE OFERTAS	1	07/06/2017	08/06/2017												
14	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	26	08/06/2017	04/07/2017												
15	SOLICITUD DE NO OBJECCION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	05/07/2017	06/07/2017												
16	NO OBJECCION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	27	06/07/2017	02/08/2017												
17	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	03/08/2017	04/08/2017												
18	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	06/08/2017	07/08/2017												
19	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	7	08/08/2017	15/08/2017												
20	SOLICITUD DE NO OBJECCION DE JICA A ADJUDICACION	1	15/08/2017	16/08/2017												
21	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	27	17/08/2017	13/09/2017												
22	PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION	4	14/09/2017	15/09/2017												
23	PUBLICADA POR LA JUNTA	1	23/09/2017	26/09/2017												
24	RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA	6	27/09/2017	03/10/2017												
25	PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES / REPOSICION A LA ADJUDICACION	1	04/10/2017	05/10/2017												
26	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	1	05/10/2017	06/10/2017												
27	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	10	06/10/2017	16/10/2017												
28	SOLICITUD DE NO OBJECCION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	1	26/10/2017	27/10/2017												
29	NO OBJECCION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	4	27/10/2017	31/10/2017												
30	INICIO DE OBRAS	1	01/11/2017	02/11/2017												
31	GENERALES	698	01/11/2017	30/09/2019												
32	MOVIMIENTO DE TIERRAS	607	01/11/2017	31/07/2019												
33	ALCANTARILLAS	637	01/11/2017	30/09/2019												
34	RENGLONES VARIOS	637	01/11/2017	30/09/2019												
35	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	486	01/06/2018	30/09/2019												
36	SEÑALIZACION	92	01/06/2018	01/09/2019												
37	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	01/07/2019	30/09/2019												
38	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	668	01/12/2017	30/09/2019												
39	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS	30	01/08/2018	31/08/2019												

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
Tarea 4 - SAN JUAN CHACTELA - IXCAN																
No	PUBLICACION DE BASES EN	1	20/07/2017	21/07/2017	20/07/2017	20/07/2017										
1	GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	59	21/07/2017	21/03/2017	21/07/2017											
2	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	25	23/07/2017	17/02/2017												
3	LICITACION	8	20/02/2017	10/03/2017												
4	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	1	22/03/2017	23/03/2017												
5	RECEPCION DE OFERTAS	26	23/03/2017	18/04/2017												
6	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	1	19/04/2017	20/04/2017												
7	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	27	20/04/2017	17/05/2017												
8	OFERTAS TECNICAS	1	18/05/2017	19/05/2017												
9	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	21/05/2017	22/05/2017												
10	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	7	23/05/2017	30/05/2017												
11	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS	1	30/05/2017	31/05/2017												
12	SOLICITUD DE NO OBJECCION DE JICA A ADJUDICACION	27	01/06/2017	28/06/2017												
13	NO OBJECCION DE JICA A ADJUDICACION	1	29/06/2017	30/06/2017												
14	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	4	03/07/2017	07/07/2017												
15	PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA PUBLICADA POR LA JUNTA	1	10/07/2017	18/07/2017												
16	APROBACION CIV A LA ADJUDICACION	6	12/07/2017	18/07/2017												
17	PERIODO DE ESPERA INCONFORMIDADES/ REPOSICION A LA ADJUDICACION	13	18/07/2017	01/08/2017												
18	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	1	02/08/2017	03/08/2017												
19	CONTRATACION DE LAS OBRAS	25	04/08/2017	29/08/2017												
20	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	1	30/08/2017	12/09/2017												
21	SOLICITUD DE NO OBJECCION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	5	15/09/2017	01/10/2017												
22	NO OBJECCION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS	0	01/10/2017	01/10/2017												
23	INICIO DE OBRAS	729	01/10/2017	30/09/2019												
24	GENERAL	607	01/10/2017	31/05/2019												
25	MOVIMIENTO DE TIERRAS	668	01/11/2017	31/08/2019												
26	ALCANTARILLAS	698	01/11/2017	30/09/2019												
27	RENGONES VARIOS	547	01/04/2018	30/09/2019												
28	RENGONES VARIOS	121	01/06/2019	30/09/2019												
29	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	91	01/07/2019	30/09/2019												
30	SEÑALIZACION	729	01/10/2017	30/09/2019												
31	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL SOCIAL	61	01/07/2018	31/08/2018												
32	MEIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR.															
33	PUNTES Y BOVEDAS															

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
Título 5: LANQUIN - CAHARON																
1	PUBLICACION DE BASES EN GUATECOMPRAS Y DIARIO OFICIAL	1	20/01/2017	24/01/2017	20/01/2017	20/01/2017										
2	PERIODO DE PREPARACION DE OFERTAS	59	24/01/2017	24/03/2017	24/07/2017		1									
3	NOI BRAMIENTOS DE LA JUNTA DE LICITACION	25	23/01/2017	17/02/2017			2									
4	CAPACITACION A LA JUNTA DE LICITACION	8	20/02/2017	10/03/2017			3									
5	RECEPCION DE OFERTAS	1	22/03/2017	23/03/2017			4									
6	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	26	23/03/2017	19/04/2017			5									
7	EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS A SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A	1	19/04/2017	20/04/2017			6									
8	NO OBJECION DE JICA A EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS	27	20/04/2017	17/05/2017			7									
9	AVISO A LAS EMPRESAS PARA APERTURA DE OFERTA ECONOMICA	1	18/05/2017	19/05/2017			8									
10	APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS	1	24/05/2017	22/05/2017			9									
11	EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS A SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A	7	23/05/2017	30/05/2017			10									
12	SOLICITUD DE NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	1	30/05/2017	31/05/2017			11									
13	NO OBJECION DE JICA A ADJUDICACION	27	01/06/2017	29/06/2017			12									
14	PUBLICACION DEL ACTA Y RESOLUCION DE ADJUDICACION	1	29/06/2017	30/06/2017			13									
15	PERIODO DE ESPERA PARA INCONFORMIDADES A LA ADJUDICACION	4	03/07/2017	07/07/2017			14									
16	PUBLICADA POR LA JUNTA RECOMENDACION ADJUDICACION JUNTA LICITACION	1	10/07/2017	11/07/2017			15		Q2,680,000.00	Q1,320,573.02	Q2,680,000.00	Q0.00	0.00%	0.85%	0%	S
17	PERIODO DE ESPERA A LA ADJUDICACION	6	12/07/2017	18/07/2017			16									
18	REPOSICION A LA ADJUDICACION	13	19/07/2017	01/08/2017			17									
19	NOTIFICACION A LA EMPRESA ADJUDICADA	1	02/08/2017	03/08/2017			18									
20	CONTRATACION DE LAS OBRAS	25	04/08/2017	29/08/2017			19									
21	ACUERDO MINISTERIAL PARA APROBACION DE LAS OBRAS	13	30/08/2017	12/09/2017			20									
22	SOLICITUD DE NO OBJECION A JICA DEL CONTRATO DE OBRAS	1	13/09/2017	14/09/2017			21									
23	NO OBJECION DE JICA A CONTRATO DE OBRAS GENERALES	6	15/09/2017	01/10/2017			22									
24	INICIO DE OBRAS	0	01/10/2017	01/10/2017			23									
25	MOVIMIENTO DE TIERRAS	729	01/10/2017	30/09/2019			24									
26	ALCANTARILLAS	607	01/10/2017	31/05/2019			25									
27	RENGLONES VARIOS	668	01/11/2017	31/08/2019			24 Y 25									
28	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	547	01/04/2018	30/09/2019			25, 26 Y 27									
29	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	91	01/06/2019	30/09/2019			29									
30	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	729	01/10/2017	30/09/2019			24									
31	PUENTES Y BOVEDAS	61	01/07/2018	31/08/2018			24									

Observaciones/Desafíos

Los tramos I, II, IV y V del componente de obra civil se encuentran actualmente en etapa de licitación de obras por lo cual actualmente las cantidades son estimadas por la institución, en el momento de adjudicar los proyectos se conocerá el programa real de trabajo.

El tramo III se encuentra pendiente de iniciar el proceso de licitación debido a gestiones previas realizadas entre la DGC y el departamento de Crédito Público del MINFIN.
Riesgos:

Los proyectos se encuentran actualmente en etapa de licitación, por lo que las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos que modifiquen los tiempos estimados en el presente plan tales como:

- Inconformidades o impugnaciones a los procesos de licitación por oferentes.
- Por ser cinco procesos de licitación en simultáneo, atraso en las NO OBJECIONES a lo actuado por la JUNTA y a la adjudicación por parte de JICA.
- El costo programado es en base al cálculo realizado por la institución, el cual variara con el costo de los oferentes, así como la programación.
- Con la variación del costo esto cambiaría el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.

Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse en forma simultánea).

Que no exista cuota financiera aprobada de alguna de las fuentes de financiamiento.

Que sea cierre de cuatrimestre cuando los recursos del préstamo sean depositados por lo que el sistema SICOIN ya esté cerrado.

Que el banco no apruebe el desembolso por incumplimiento de compromisos adquiridos en otros préstamos del mismo banco.

Elaborado por: (nombre y firma)



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
División de Planificación y Estudios

Aprobado por: (nombre y firma)



Ing. Civil Armando Fuentes Roca
Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización FEBRERO 2017
